

库尔勒市 2024 年度预算 绩效评价报告

项目名称：巴财建〔2024〕81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目

项目单位：库尔勒市住房和城乡建设局

主管部门：库尔勒市住房和城乡建设局

委托单位：库尔勒市财政局（国资委）

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

单位：万元、个、份

项目名称	巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目			评价年度	2024年
财政局分管科室	库尔勒市财政局（国资委）经建科		联系人及联系方式	林春香 13565023682	
项目主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局		联系人及联系方式	马文俊 19354552119	
项目实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局		联系人及联系方式	付子腾 15276280701	
资金来源	地方政府专项债券资金 26000 万元和地方配套资金 6500 万				
项目资金投入总额	32500	项目资金执行数	10000	总执行率	30.77%
2024年投入总额	5000	2024年执行数	5000	2024年资金执行率	100%
发放调查问卷	66	回收有效问卷	66	满意度情况	69.94%
采用的评价方法与评价标准	<p>（一）采用的评价方法：主要运用公众评判法、成本效益分析法、因素分析法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文）</p> <p>（二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。</p>				
绩效评价结果	根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、对比分析等方式，对“巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 86.62 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策 19 分，得分率 95%；项目过程 14 分，得分率 70%；项目产出 45.42 分，得分率 90.84%；项目效益 8.5 分，得分率 85%。				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

2018年8月新疆发布了《丝绸之路经济带核心区建设发展报告》，报告从政策沟通、设施联通、经贸合作、人文交流、资金融通、体制机制6个方面总结了目前新疆参与“一带一路”建设的工作要点，提出当前和今后一个时期，核心区建设将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》，以核心区商贸物流中心建设为突破口，带动交通枢纽中心、文化科教中心发展。同时，坚持引进来和走出去并重，坚持市场导向和企业主体工作导向，着力形成全方位对外开放新格局，而本项目的建设正是响应了国家的政策，巴州城市基础设施更新改造的建设不仅改善了区域交通运输条件，构建库尔勒地区综合运输体系，适应通道交通量快速增长需要，加快地区社会经济发展、实现各民族共同繁荣发展有力保障，巩固国防，促进政治稳定，保障国家安全，提高交通快速机动保障能力。

根据《库尔勒市城市总体规划（2011-2030）》、《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035）》、《库尔勒市国民经济和社会发展的第十四五个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金的通知》（库财文〔2022〕111号）



文件要求，经库尔勒市住房和城乡建设局研究决定申报项目，并由库尔勒市住房和城乡建设局实施。

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知总投资32500万元，其中来自地方政府专项债券资金26000万元，来自地方配套资金6500万，本项目涉及地方政府一般债券资金5000万元。改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网24676米，新建4座移动式公共卫生间与15座公共卫生间、改造18座公共卫生间，开展高压电力迁改巴黎一线、鲁克索一二线电力线路约16处，其中10千伏及以下项目3处、35千伏及以上项目3处。

（二）项目实施情况

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知主要内容：项目总投资32500万元，本项目涉及资金5000万元。改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网，新建及改造公共基础设施，高压电力迁改。项目于2024年6月1日开工，截至2024年12月31日，完成改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网7940米，新建及改造公共基础设施26座，高压电力迁改16处。2024年8月20日出具高压电力迁改竣工验收报告。该项目实施后提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。



(三) 绩效目标

1. 总目标

目标一：提升改造排水管网24676米，公共基础设施37处，电力迁改16处。

目标二：提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。

2. 年度绩效目标

根据《2024年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2024年度绩效目标如下：

表 1-1 巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升改造排水管网	≥ 24676 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共基础设施	≥ 37 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高压电力迁改	=16 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2024年6月1日之前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		资金支付完成时间	2024年10月30日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		高压电力	2024年11	计划标准	-	5	直接赋分	原始



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
		迁改完成时间	月 30 日之前	准			分	凭证
成本指标	经济成本指标	新建设施改造成本	≤3000 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建改造公厕成本	≤1000 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高压电力迁改成本	≤1000 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施建设	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知进行了独立客观地评价，最终评分结果为86.62分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表2。

表 1-2 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19	95%
项目过程	20	14	70%
项目产出	50	45.42	90.84%
项目效益	10	8.5	85%
合计	100	86.62	86.62%



(二) 预算执行情况

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知安排总额为32500万元,其中:地方配套投入6500万元,地方政府一般债券资金投入26000万元。截至2024年12月31日,地方配套资金6500万元未到位,地方政府一般债券资金到位10000万元,本项目涉及资金5000万元,实际支出5000万元,资金执行率为100%。

(三) 项目绩效情况

本年度,项目按计划高质量完成各项任务:提升改造排水管网7940米、更新完善公共基础设施26处、实施电力迁改16处。项目的成功实施,不仅直接提升了城市基础设施的服务保障能力,更有效改善了城市的整体生活环境。其综合效益体现在多个层面:市民日常生活更加便捷舒适,城市面貌焕然一新,城市运行更安全高效,人居环境质量显著改善,为城市可持续发展注入了新活力。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

1.加强领导, 落实责任

库尔勒市住房和城乡建设局高度重视巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知工作,为保证工程项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,经库尔勒市住房和城乡建设局与库尔勒盛城公共设施建设投资有限公司双方协商同意,签署巴州



城市基础设施更新改造项目运营管理协议，库尔勒市住房和城乡建设局将工程基础设施建设项目交给库尔勒盛城公共设施投资有限公司进行建设管理，并进行全程监督检查。

2.强化监管，确保质量

为确保工程质量监管到位，聘请运营企业负责整个工程的全程监督管理，库尔勒市住房和城乡建设局等部门领导也多次到现场进行指导。领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，明确了责任领导，单位选派工作责任心强、熟悉工程的业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

(二) 存在问题与不足

1.未按规定配套资金

根据初步设计及《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目〔2024〕116号)，2024年该项目应到位地方财政配套资金6500万元，查阅项目相关支付凭证，实际地方财政配套资金未到位。

2.项目预算编制与实际中标金额偏差较大

根据项目可行性研究报告的批复、初设批复、巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议等相关资料可知，巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知预算32500万元，通过项



目工程总承包合同核实，项目合同金额 9748.07 万元，项目预算与实际中标金额偏差为 70.01%。

3.项目实施过程不规范

根据相关合同和现场评价中发现一标段施工图纸目前正在审核中，施工许可证未办理，环评备案情况不明确；管理运营协议于 2024 年 4 月 27 日签订，一标段监理日志于 2024 年 4 月 18 日开始，时间逻辑关系不合理。

(三) 建议和改进措施

1.加快财政资金拨付进度

建议财政部门严格按照项目相关批复中的资金筹资计划安排，加快本项目财政预算资金的拨付进度。同时建议财政部门加强对项目单位的指导，明确专项债资金的适用范围，提高主管部门资金管理水平。

2.加强项目预算编制科学性

建议实施单位加强对项目预算编制人员的培训和教育力度，提高其专业素养和业务能力。通过举办培训班、研讨会等方式，普及预算编制知识和技能，提高预算编制人员的综合素质和水平，避免出现项目预算与项目实际支出偏差较大，确保预算的准确性和可靠性。

3.落实项目监督管理，切实履行部门职责

建议对一标段及项目整体进行全面“合规性体检”。对发现的施工许可缺失、环评不明、图纸未审、时间逻辑错误等问题，逐一制定整改清单，明确责任主体、整改措施和完成时限，确保所有程序合规性“清零”到位后方可继续推进。



目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	6
二、评价工作概述	7
(一) 评价目的与原则	7
(二) 评价方法	8
(三) 绩效评价指标体系	8
(四) 评价组织实施	10
三、评价结论	12
(一) 评价结论	12
(二) 项目绩效情况	14
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	22



五、主要经验及存在问题	23
(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在问题	24
六、相关建议	24
(一) 加快财政资金拨付进度	24
(二) 加强项目预算编制科学性	25
(三) 落实项目监督管理, 切实履行部门职责	25
七、绩效评价结果应用建议	25
(一) 及时对评价中发现问题进行整改	25
(二) 下一年度预算安排	25
(三) 评价结果公开	26
八、其他需要说明的问题	26
附件 1 评价指标体系	27
附件 2 基础表	38
附件 3 满意度问卷	40
附件 4 问卷调查报告	43
附件 5 访谈提纲	48
附件 6 现场照片	50



巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目预算绩效评价报告

受库尔勒市财政局（国资委）委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2025年6月10日至2025年7月31日对库尔勒市住房和城乡建设局负责管理实施的巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

2018年8月新疆发布了《丝绸之路经济带核心区建设发展报告》，报告从政策沟通、设施联通、经贸合作、人文交流、资金融通、体制机制6个方面总结了目前新疆参与“一带一路”建设的工作要点，提出当前和今后一个时期，核心区建设将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》，以核心区商贸物流中心建设为突破口，带动交通枢纽中心、文化科教中心发展。同时，坚持引进来和走出去并重，坚持市场导向和企业主体工作导向，着力形成全方位对外开放新格局，而本项目的建设正是响应了国家的政策，巴州城市基础设施更新改造的建设不仅改善了区域交通运输条件，构建库尔勒地区综合运



输体系，适应通道交通量快速增长需要，加快地区社会经济发展、实现各民族共同繁荣发展有力保障，巩固国防，促进政治稳定，保障国家安全，提高交通快速机动保障能力。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

根据《库尔勒市城市总体规划（2011-2030）》、《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035）》、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四五个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金的通知》（库财文〔2022〕111号）文件要求，经库尔勒市住房和城乡建设局研究决定申报项目，并由库尔勒市住房和城乡建设局实施。

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知主要建设内容：项目总投资32500万元，本项目涉及资金5000万元。改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网，新建及改造公共基础设施，高压电力迁改。项目于2024年6月1日开工，截至2024年12月31日，完成改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网7940米，新建及改造公共基础设施26座，高压电力迁改16处。2024年8月20日出具高压电力迁改竣工验收报告。该项目实施后提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提



升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。

2.项目规模及范围

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知总投资32500万元，其中：地方一般债券资金26000万元、地方配套资金6500万，本项目涉及资金5000万元。改建库尔勒市迎宾路老旧水电气热管网24676米，新建4座移动式公共卫生间与15座公共卫生间、改造18座公共卫生间，开展高压电力迁改巴梨一线、鲁克索一二线电力线路约16处，其中10千伏及以下项目3处、35千伏及以上项目3处。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知安排总额为32500万元，其中：地方配套投入6500万元，占项目总投资20%；地方政府一般债券资金投入26000万元，占项目总投资80%。截至2024年12月31日，地方配套资金6500万元未到位，地方政府一般债券资金到位10000万元，本项目涉及资金5000万元。

2.资金使用情况



巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知收到地方政府一般债券资金10000万元，本项目涉及资金5000万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出5000万元，资金执行率为100%。项目资金执行情况见下表：

表 1-1 巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知资金执行情况表

单位：万元

序号	支出时间	支出金额	支出摘要	运营单位	备注
1	8月28日	1000	住建局支付库尔勒盛城公共设施投资有限公司-巴州城市基础设施更新改造项目资金	库尔勒盛城公共设施投资有限公司	
2	10月25日	3000	住建局支付库尔勒盛城公共设施投资有限公司-巴州城市基础设施更新改造项目资金	新疆华玺建设工程有限公司	
3	10月28日	1000	住建局支付库尔勒盛城公共设施投资有限公司-巴州城市基础设施更新改造项目资金	新疆华玺建设工程有限公司	
总计		5000			

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目资金拨付部门为库尔勒市财政局（国资委），项目主管部门为库尔勒市住房和城乡建设局，实施单位为库尔勒盛城公共设施投资有限公司，各单位职责如下：

库尔勒市财政局（国资委）：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。



库尔勒市住房和城乡建设局：主要负责组织项目申报和绩效目标设置，并对项目实施情况进行全过程跟踪问效，负责项目资金支付、使用管理，制定项目资金管理办法，对项目绩效管理工作进行自评。

库尔勒盛城公共设施建投投资有限公司：依照合同约定全过程组织项目建设实施，负责完成项目建设、质量、工期和安全目标。根据国家相关规定的程序，公开招标选择专业工作单位。如施工、监理或其它有关单位，并负责有关合同的洽谈和签订以及管理、监督合同全过程的履行。按照保质量、保工期和降低成本的原则，审核并批准工程施工组织设计和技术方案，同时上报库尔勒市住房和城乡建设局。对于不符合设计要求及国家质量标准材料、构配件、设备等，有权要求监理单位通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，通知施工方停工整改、返工。审核、签证工程进度报表，检查、监督工程施工进度。

2.资金管理情况

本项目资金由库尔勒市财政局（国资委）下拨库尔勒市住房和城乡建设局，资金支付由库尔勒市财政局（国资委）通过国库支付中心直接支付。库尔勒市住房和城乡建设局根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32号）、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》等资金管



理规定，严格落实对项目资金监管，做到项目资金专款专用，未发现使用项目资金的情况。严格执行国家有关财务、会计制度，实行专人管理、专账核算、专款专用。资金支付实行报账制，严格实行财政国库集中支付管理制度，按照批准的年度预算和用款计划拨付，不得办理无预算、无项目、无用款计划、超预算、超计划的拨付，不得擅自改变支出用途。并接受财政局、审计局日常监督和检查，切实加强资金使用的跟踪检查和审计。

（五）项目绩效目标

1.总目标

目标一：提升改造排水管网 24676 米，公共基础设施 37 处，电力迁改 16 处。

目标二：提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。

2.年度绩效目标

根据《2024 年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金 2024 年度绩效目标如下：

表 1-2 巴财建[2024]81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升改造排水管网	≥ 24676 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共基础	≥ 37 座	计划标	-	6	按照完	工作



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
		设施		准			按比例赋分	资料
		高压电力迁改	=16处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2024年6月1日之前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		资金支付完成时间	2024年10月30日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		高压电力迁改完成时间	2024年11月30日之前	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建设施改造成本	≤3000万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建改造公厕成本	≤1000万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高压电力迁改成本	≤1000万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施建设	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知进行绩效



评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用公众评判法、成本效益分析法、因素分析法，具体评价方法如下：

公众评判法：巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知评价小组通过对群众发放满意度问卷抽样调查等方式进行评判的方法。

成本效益分析法：巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知评价小组将专项资金投入与项目的产出及效益进行关联性分析，对专项目资金进行评价。

因素分析法：巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知评价小组结合专项实际情况综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，对项目进行评价。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、



过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目绩效评



价总分值 100 分,根据综合评分结果,评价计分 90 分—100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为“优”,80—90 分(含 80 分)对应的评分结果级别为“良”,60—80 分(含 60 分)对应的评分结果级别为“中”,60 分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

(四) 评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为库尔勒市财政局(国资委),受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作,公司高度重视此次库尔勒市财政局(国资委)对重点评价工作的要求,配备专门人力,重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下:

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制,技术指导
3	邝仕锦	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集,整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等,并协助撰写工作方案及评价报告等
5	肖一梅	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等,并协助撰写工作方案及评价报告等
6	李泽峰	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2. 评价进度



本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 12 日前

受库尔勒市财政局（国资委）委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与库尔勒市住房和城乡建设局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 7 月 5 日前

数据采集（2025 年 6 月 20 日前）。将基础表发送至库尔勒市住房和城乡建设局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 7 月 5 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 23 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交库尔勒市住房和城乡建设局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。



报告提交（2025年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交库尔勒市财政局（国资委），并根据库尔勒市财政局（国资委）的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知进行了独立客观地评价，最终评分结果为86.62分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19	95%
项目过程	20	14	70%
项目产出	50	45.42	90.84%
项目效益	10	8.5	85%
合计	100	86.62	86.62%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	A3 资金投入(6)	A301 预算编制科学性	4	科学	基本科学	3	75%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程(20)	B1 资金管理(12)	B101 资金到位率	5	100%	0%	0	0%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	有效	基本有效	3	75%
C 项目产出(50)	C1 产出数量(15)	C101 提升改造排水管网	5	≥ 24676 米	7940 米	1.61	32.20%
		C102 公共基础设施	5	≥ 37 座	26 座	3.51	70.20%
		C103 高压电力迁改	5	=16 处	16 处	5	100%
	C2 产出质量(5)	C201 资金使用合规率	5	=100%	100%	5	100%
	C3 产出时效(15)	C301 计划开工时间	5	2024 年 6 月 1 日之前	2024 年 6 月 1 日	5	100%
		C302 资金支付完成时间	5	2024 年 10 月 30 日之前	2024 年 10 月 28 日	5	100%
		C303 高压电力迁改完成时间	5	2024 年 11 月 30 日之前	2024 年 8 月 20 日	5	100%
	C4 产出成本(15)	C401 新建设施改造成本	5	≤ 3000 万元	3000 万元	5	100%
		C402 新建改造公厕成本	5	≤ 1000 万元	1000 万元	5	100%
		C403 高压电力迁改成本	5	≤ 1000 万元	1000 万元	5	100%
D 项目效益(10)	D1 项目效益(5)	D101 发生重大事故	5	=0 起	0 起	5	100%
	D2 满意度(5)	D201 群众满意度	5	$\geq 95\%$	69.94%	0	0%
总分			100			86.62	86.62%



（二）项目绩效情况

本年度，项目按计划高质量完成各项任务：提升改造排水管网 7940 米、更新完善公共基础设施 26 处、实施电力迁改 16 处。项目的成功实施，不仅直接提升了城市基础设施的服务保障能力，更有效改善了城市的整体生活环境。其综合效益体现在多个层面：市民日常生活更加便捷舒适，城市面貌焕然一新，城市运行更安全高效，人居环境质量显著改善，为城市可持续发展注入了新活力。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19 分，得分率 95%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

①政策依据《库尔勒市城市总体规划（2011-2030）》、《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035）》、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》（巴发改项目〔2024〕116 号）、《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金的通知》（库财文〔2022〕111 号）等相关文件；②依据现场考察分析，项目与库尔勒市住房和城乡建设局工作计划相匹配；③依据《库尔勒市住房和城乡建设局



职能配置、内设机构和人员编制规定》可知，项目与库尔勒市住房和城乡建设局职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

①项目依据《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》（巴发改项目〔2024〕116号）、党组会议纪要、项目初步设计等相关资料；②项目立项程序规范，依托《库尔勒市城市总体规划(2011-2030)》、《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035）》、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》申报预算项目；③依据《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金的通知》（库财文〔2022〕111号）可知审批文件和材料合规。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

①依据库尔勒市住房和城乡建设局提供的《巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知》绩效目标申报表，该项目设立了总目标和年度目标；②依据项目相关合同与项目初步设计资料分析，项目年度目标明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，指标中有时间限制。



综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性

①依据库尔勒市住房和城乡建设局提供的《巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知》绩效目标申报表，绩效目标细化分解了12条具体的三级指标；②项目绩效目标指标量化率为91.67%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》70%的要求；③根据项目施工合同、初步设计及库尔勒市住房和城乡建设局提供本项目的年度绩效目标申报表可知，绩效目标与项目目标任务数相对应。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

①依据项目申报表、初设批复、《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》（巴发改项目〔2024〕116号）等相关资料，库尔勒市住房和城乡建设局预算编制经过科学论证；②依据可行性研究报告和初设批复，预算内容与项目内容匹配；③项目总投资预算额度测算依据充分，按照初设批复标准编制；④根据项目可行性研究报告的批复、初设批复、巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议等相关资料可知，巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债



券) 资金预算的通知预算 32500 万元, 通过项目工程总承包合同核实, 项目合同金额 9748.07 万元, 项目预算与实际中标金额偏差为 70.01%, 扣除 1 分。

综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准得 3 分, 得分率 75%。

(2) 资金分配合理性

①依据《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金的通知》(库财文〔2022〕111号)、项目申报表分析, 预算资金分配依据充分; ②依据单位项目申报表, 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应。

综上所述, 该指标分值 2 分, 根据评分标准得 2 分, 得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看, 此项评价满分为 20 分, 绩效评价得分 14 分, 得分率 70%, 具体分析如下:

1. 资金管理

(1) 资金到位率

根据初步设计及《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目〔2024〕116号), 2024 年该项目应到位地方财政配套资金 6500 万元, 查阅项目相关支付凭证, 实际地方财政配套资金未到位。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 0 分, 得分率 0%。

(2) 预算执行率



通过对库尔勒市住房和城乡建设局财务会计凭证进行审核，2024年12月31日到位债券资金10000万元，截至2024年12月31日已向运营企业支付资金10000万元，涉及本项目资金5000万元。用于巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知，资金执行率100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

①通过支付凭证、巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议和现场评价中可知，截至2024年12月31日5000万元已用于支付项目工程款；②通过查看合同和付款凭证、资金的拨付审批手续齐全；③通过查阅合同与项目立项批复文件，项目资金使用符合项目预算批复用途；④通过查看合同、国库集中支付凭证及项目支出明细，资金不存在截留。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

①依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32号）及现场实地考察，该项目制定了《库尔勒市住房和城乡建设局财务管理制度》、《库尔勒市住房和城乡建设局合同管理



制度》、《库尔勒市住房和城乡建设局合同管理内部控制制度》、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》等相关财务制度；②相关财务制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

①依据中标通知书、招投标资料、发票、工程质量评估报告等资料进行印证，绩效监控情况表、绩效自评表在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据库尔勒市住房和城乡建设局项目资金使用调研工作汇报材料、党组会议纪要，项目无支出调整；③依据项目相关合同、支付凭证、工程日志及现场考场分析，一标段施工许可证未办理且管理运营协议于 2024 年 4 月 27 日签订，一标段监理日志于 2024 年 4 月 18 日开始，时间逻辑关系不合理，扣除 1 分；④依据项目施工日志、监理日志、监理月报分析，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3 分，得分率 75%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 45.42 分，得分率 90.84%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）提升改造排水管网



此条指标标杆值为 24676 米。依据基础表、监理月报、施工资料及现场访谈分析，提升改造排水管网 7940 米。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 1.61 分，得分率 32.20%。

(2) 公共基础设施

此条指标标杆值为 37 座。依据基础表、监理月报、施工资料及现场访谈分析，公共基础设施 26 座。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 3.51 分，得分率 70.20%。

(3) 高压电力迁改

此条指标标杆值为 16 处。依据基础表、监理月报、施工资料、三标段竣工验收报告及现场访谈分析，高压电力迁改 16 处。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 产出质量

(1) 资金使用合规率

此条指标标杆值为 100%。依据党组会议纪要、财务资料及现场考察分析，资金使用合规率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3. 产出时效

(1) 计划开工时间



此条指标标杆值为 2024 年 6 月 1 日之前。依据项目工程开工报告、中标通知书、施工合同及现场访谈分析，项目于 2024 年 6 月 1 日开工，已达到目标值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 资金支付完成时间

此条指标标杆值为 2024 年 10 月 30 日之前。依据国库集中支付凭证及现场访谈分析，资金于 2024 年 10 月 28 日已支付 5000 万元，已达到目标值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 高压电力迁改完成时间

此条指标标杆值为 2024 年 11 月 30 日之前。依据基础表、监理月报、施工资料、三标段竣工验收报告及现场访谈分析，高压电力迁改完成时间为 2024 年 8 月 20 日，已达到目标值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

4. 产出成本

(1) 新建设施改造成本

此条指标标杆值为 3000 万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，新建设施改造成本 3000 万元。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 新建改造公厕成本

此条指标标杆值为1000万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，新建改造公厕成本1000万元。

综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得5分，得分率100%。

(3) 高压电力迁改成本

此条指标标杆值为1000万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，高压电力迁改成本1000万元。

综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得5分，得分率100%

(四) 项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10 分，绩效评价得分 8.5 分，得分率 85%，具体分析如下：

1.项目效益

(1) 发生重大事故

此条指标标杆值为0起。依据党组会议纪要、监理月报、施工记录及现场考察分析，项目实施过程中未发生重大事故。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.满意度



（1）群众满意度

此条指标标杆值为95%评价组通过对群众进行问卷调查，共收集66份有效问卷，经过对满意度问卷数据分析，整体满意程度69.94%，未达到年初设定的目标值。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得3.5分，得分率70%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任

库尔勒市住房和城乡建设局高度重视巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知工作，为保证工程项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经库尔勒市住房和城乡建设局与库尔勒盛城公共设施建设投资有限公司双方协商同意，签署巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议，库尔勒市住房和城乡建设局将工程基础设施建设项目交给库尔勒盛城公共设施建设投资有限公司进行建设管理，并进行全程监督检查。

2.强化监管，确保质量

为确保工程质量监管到位，聘请运营企业负责整个工程的全程监督管理，库尔勒市住房和城乡建设局等部门领导也多次到现场进行指导。领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，明确了责任领导，单位选派工作责任心强、熟悉工程的业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，



重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

(二) 存在问题

1.未按规定配套资金

根据初步设计及《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目〔2024〕116号)，2024年该项目应到位地方财政配套资金6500万元，查阅项目相关支付凭证，实际地方财政配套资金未到位。

2.项目预算编制与实际中标金额偏差较大

根据项目可行性研究报告的批复、初设批复、巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议等相关资料可知，巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知预算32500万元，通过项目工程总承包合同核实，项目合同金额9748.07万元，项目预算与实际中标金额偏差为70.01%。

3.项目实施过程不规范

根据相关合同和现场评价中发现一标段施工图纸目前正在审核中，施工许可证未办理，环评备案情况不明确；管理运营协议于2024年4月27日签订，一标段监理日志于2024年4月18日开始，时间逻辑关系不合理。

六、相关建议

(一) 加快财政资金拨付进度

建议财政部门严格按照项目相关批复中的资金筹资计划安排，加快本项目财政预算资金的拨付进度。同时建议财



政部门加强对项目单位的指导，明确专项债资金的适用范围，提高主管部门资金管理水平。

(二) 加强项目预算编制科学性

建议实施单位加强对项目预算编制人员的培训和教育力度，提高其专业素养和业务能力。通过举办培训班、研讨会等方式，普及预算编制知识和技能，提高预算编制人员的综合素质和水平，避免出现项目预算与项目实际支出偏差较大，确保预算的准确性和可靠性。

(三) 落实项目监督管理，切实履行部门职责

建议对一标段及项目整体进行全面“合规性体检”。对发现的施工许可缺失、环评不明、图纸未审、时间逻辑错误等问题，逐一制定整改清单，明确责任主体、整改措施和完成时限，确保所有程序合规性“清零”到位后方可继续推进。

七、绩效评价结果应用建议

(一) 及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报库尔勒市财政局（国资委）。

(二) 下一年度预算安排

项目进行综合性绩效评价结论为“良”。通过项目的实施，改善区域的交通条件、道路沿线的商业环境，提高行车舒适性，又能美化街道环境，也方便周边居民出行，同时提升沿线城市形象，促进商业繁荣，从而为区域土地升值及



进一步开发提供良好的“硬件”基础，有利于提升库尔勒市的
的城市形象。因此建议予以资金优先保障，继续推进。

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照
政府信息公开有关规定，由库尔勒市财政局（国资委）将本
次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提
高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由库尔勒市住房和城乡建设
局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存
在局限性，可能影响本次评价结果。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分, 是否与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	评价要点: ①有相关政策依据 (国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	①政策依据《库尔勒市城市总体规划 (2011-2030)》、《库尔勒市国土空间总体规划 (2021-2035)》、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目 (2024) 116 号)、《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目 (地方一般债券) 资金的通知》(库财文 (2022) 111 号) 等相关文件; ②依据现场考察分析, 项目与库尔勒市住房和城乡建设局工作计划相匹配; ③依据《库尔勒市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》可知, 项目与库尔勒市住房和城乡建设局职责密切相关。综上所述, 该指标分值 4 分, 依据评分标准得 4 分, 得分率 100%。	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	评价要点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料内容是否合规完整;以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	①项目依据《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目〔2024〕116号)、党组会议纪要、项目初步设计等相关资料;②项目立项程序规范,依托《库尔勒市城市总体规划(2011-2030)》、《库尔勒市国土空间总体规划(2021-2035)》、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》申报预算项目;③依据《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金的通知》(库财文〔2022〕111号)可知审批文件和材料合规。综上所述,该指标分值 4 分,依据评分标准得 4 分,得分率 100%。	4	100.00 %
	A2 绩效目标(6)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量	合理	通用标准	评价要点:①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分);②依据项目总目标、年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目	①依据库尔勒市住房和城乡建设局提供的《巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金预算的通知》绩效目标申报表,该项目设立了总目标和年度目标;②依据项目相关合同与项目初步设计资料分析,项目	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				性、可实现性、相关性和时限性。			标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/12的剩余权重分。	年度目标明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，指标中有时间限制。综上所述，该指标分值3分，依据评分标准得3分，得分率100%。		
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①依据库尔勒市住房和城乡建设局提供的《巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知》绩效目标申报表，绩效目标细化分解了12条具体的三级指标；②项目绩效目标指标量化率为91.67%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》70%的要求；③根据项目施工合同、初步设计及库尔勒市住房和城乡建设局提供本项目的年度绩效目标申报表可知，绩效目标与项目目标任务数相对应。综上所述，该指标分值3分，依据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	4	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 25%权重分, 符合则得对应权重分, 否则不得分	①依据项目申报表、初设批复、《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(巴发改项目〔2024〕116号)等相关资料, 库尔勒市住房和城乡建设局预算编制经过科学论证; ②依据可行性研究报告和初设批复, 预算内容与项目内容匹配; ③项目总投资预算额度测算依据充分, 按照初设批复标准编制; ④依据项目工程总承包合同及可研批复核实, 项目合同金额 9748.07 万元, 可研批复投资额 32500 万元, 预算确定的项目投资额与工作任务偏差 70.01%, 扣除 1 分。综上所述, 该指标分值 4 分, 依据评分标准得 3 分, 得分率 75%。	3	75%
		A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分, 满足则得分, 否则扣除对应权重分。	①依据《关于下达自治州城市基础设施更新改造项目(地方一般债券)资金的通知》(库财文〔2022〕111号)、项目申报表分析, 预算资金分配依据充分; ②依据单位项目申报表及资金分配表, 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应。综上所述, 该指标分值 2 分, 依据评分标准得 2 分, 得	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								分率 100%。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	5	反映地方配套资金到位率	100%	通用标准	评价要点：地方配套资金到位率=实际到位地方配套资金/预算地方配套资金×100%	依据《巴州发展改革委关于巴州城市基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》（巴发改项目（2024）116号）、初步设计、财务资料及现场核实得知，该项目地方政府配套资金 6500 万元，截至 2024 年 12 月 31 日地方配套资金未到位。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 0 分，得分率 0%。	0	0%
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	评价要点：预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	通过对库尔勒市住房和城乡建设局财务会计凭证进行审核，2024 年 12 月 31 日到位债券资金 10000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已向运营企业支付资金 10000 万元，涉及本项目资金 5000 万元。用于巴财建（2024）81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知，资金执行率 100%。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等；②预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况，以上四项每项占25%权重分，符合则得对应权重分，否则不得分。	①通过支付凭证、巴州城市基础设施更新改造项目运营管理协议和现场评价中可知，截至2024年12月31日5000万元已用于支付项目工程款；②通过查看合同和付款凭证、资金的拨付审批手续齐全；③通过查阅合同与项目立项批复文件，项目资金使用符合项目预算批复用途；④通过查看合同、国库集中支付凭证及项目支出明细，资金不存在截留。综上所述，该指标分值4分，依据评分标准得4分，得分率100%。	4	100%
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则	①依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32号）及现场实地考察，该项目制定了《库尔勒市住房和城乡建设局财务管理制度》、	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				实施的保障情况。			扣除对应权重分。	《库尔勒市住房和城乡建设局合同管理制度》、《库尔勒市住房和城乡建设局合同管理内部控制制度》、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》等相关财务制度；②相关财务制度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值4分，依据评分标准得4分，得分率100%。		
		B202 制度 执行 有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用 标准	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①依据中标通知书、招投标资料、发票、工程质量评估报告等资料进行印证，绩效监控情况表、绩效自评表在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据库尔勒市住房和城乡建设局项目资金使用调研工作汇报材料、党组会议纪要，项目无支出调整；③依据项目相关合同、支付凭证、工程日志及现场考场分析，一标段施工许可证未办理且管理运营协议于2024年4月27日签订，一标段监理日志于2024年4月18日开始，时间逻辑关系不合理，扣除1分；④依据项目施工日志、监理日志、监理月报分析，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上	3	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								所述, 该指标分值 4 分, 依据评分标准得 3 分, 得分率 75%。		
C 项目 产出 (50)	C1 产出 数量 (15)	C101 提升改造排水管网	5	考察提升改造排水管网	≥24676 米	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 24676 米。依据基础表、监理月报、施工资料及现场访谈分析, 提升改造排水管网 7940 米。综上所述, 该指标分值 5 分, 依据评分标准得 1.61 分, 得分率 32.20%。	1.61	32.20%
		C102 公共基础设施	5	考察公共基础设施	≥37 座	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 37 座。依据基础表、监理月报、施工资料及现场访谈分析, 公共基础设施 26 座。综上所述, 该指标分值 5 分, 依据评分标准得 3.51 分, 得分率 70.20%。	3.51	70.20%
		C103 高压电力迁改	5	考察高压电力迁改	=16 处	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 16 处。依据基础表、监理月报、施工资料、三标段竣工验收报告及现场访谈分析, 高压电力迁改 16 处。综上所述, 该指标分值 5 分, 依据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	100%
	C2 产出 质量 (5)	C201 资金使用合规率	5	考察项目资金使用合规率	=100%	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 100%。依据党组会议纪要、财务资料及现场考察分析, 资金使用合规率 100%。综上所述, 该指标分值 5 分, 依据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C3 产出时效 (15)	C301 计划开工时间	5	考察项目开工是否及时	2024年6月1日之前	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为2024年6月1日之前。依据项目工程开工报告、中标通知书、施工合同及现场访谈分析，项目于2024年6月1日开工，已达到目标值。综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%
		C302 资金支付完成时间	5	考察项目资金支付是否及时	2024年10月30日之前	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为2024年10月30日之前。依据国库集中支付凭证及现场访谈分析，资金于2024年10月28日已支付5000万元，已达到目标值。综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%
		C303 高压电力迁改完成时间	5	考察项目高压电力迁改是否及时	2024年11月30日之前	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为2024年11月30日之前。依据基础表、监理月报、施工资料、三标段竣工验收报告及现场访谈分析，高压电力迁改完成时间为2024年8月20日，已达到目标值。综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 新建设施改造	5	考察新建设施改造成本	≤3000万元	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为3000万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，新建设施改造成本3000万元。综上所述，该指	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		成本						标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。		
		C402 新建改造公厕成本	5	考察新建改造公厕成本	≤1000 万元	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 1000 万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，新建改造公厕成本 1000 万元。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		C403 高压电力迁改成本	5	考察高压电力迁改成本	≤1000 万元	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 1000 万元。依据合同、付款审批单、国库集中支付凭证、发票及基础表分析，高压电力迁改成本 1000 万元。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
D 项目效益 (10)	D1 项目效益 (5)	D101 发生重大事故	5	考察项目实施过程是否发生重大事故	=0 起	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 0 起。依据党组会议纪要、监理月报、施工记录及现场考察分析，项目实施过程中未发生重大事故。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
	D2 满意度 (5)	D201 群众满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95 %	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则按完成比例扣分。	此条指标标杆值为 95%。评级组通过对群众进行问卷调查，共收集 66 份有效问卷，经过对满意度问卷数据分析，整体满意程度为 69.94%，未达到年初设定的目标值。综上所述，该	3.5	70%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								指标分值 5 分，依据评分标准得 3.5 分，得分率 70%。		
总分			100						86.62	86.62%



附件 2 基础表

基础表 1 巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）
资金预算的通知项目需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	提升改造排水管网	7940 米	市政公司	有	
2	公共基础设施	26 座	锦绣园林	有	
3	高压电力迁改	16 处	巴电建设安装	有	
4	计划开工时间	2024 年 6 月 1 日	城建集团	有	
5	高压电力迁改完成时间	2024 年 8 月 20 日	巴电建设安装	有	
6	新建设施改造成本	3000 万元	市政公司	有	
7	新建改造公厕成本	1000 万元	锦绣园林	有	
8	高压电力迁改成本	1000 万元	巴电建设安装	有	
9	完善城市基础设施建设	有效提升	市住建局	有	

填写单位:库尔勒市住房和城乡建设局 填写人:付子腾 联系电话:15276280701
填写日期:2025 年 7 月 1 日

注:此表由库尔勒市住房和城乡建设局付子腾填写;请提供证明相关数据的报告;



基础表2 巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件（国家、省部级或市级政策依据）	有	《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）	国发〔2014〕43号	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件（实施意见、会议纪要等）	有			
3	绩效目标设定合理性	2024年本项目专项资金的绩效目标	有			
4	预算执行率	预算资金申请文件	有	巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知	库财文调〔2024〕171号	
5		预算资金批复相关文件	有	巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知	库财文调〔2024〕171号	
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有			
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有			
8	资金使用情况	资金支出明细	有			
		资金的拨付完整的审批程序和手续	有			
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	有			
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核（含评审、公示、申诉机制）、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有			
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料				

填写单位：库尔勒市住房和城乡建设局 填写人：付子腾 联系电话：15276280701 填写日期：2025年7月1日

注：本表由库尔勒市住房和城乡建设局付子腾填写；上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，请提供相应政策制度文件或证明材料。



附件 3 满意度问卷

巴财建〔2024〕81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受库尔勒市财政局（国资委）的委托，我公司对巴财建〔2024〕81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知的辖区群众满意程度展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 6 月

1:您的性别？

A:男

B:女

答案：_____

2:您的身份？

A:周边居民

B:商户经营者

C:上班族（通勤经过）

D:其他

答案：_____



3:施工期间的安全警示（如围挡、警示灯）是否到位？

A:警示充分，安全感强

B:警示不足，存在安全隐患

C:未注意到警示措施

答案：_____

4:您对项目施工期间的噪音、尘土等影响是否满意？

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案：_____

5:您对项目施工期间的交通疏导措施是否满意？

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案：_____

6:您对项目施工期间的沟通与信息公示是否满意？

A:1分



B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

7:施工期间, 您认为公厕设置的临时替代方案是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

8:您对电力改迁施工过程是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

9:您对项目未来完成后的效果有何期待?

答案: _____



附件 4 问卷调查报告

巴财建〔2024〕81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的受益群体，为辖区群众。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别？

您的身份？

施工期间的安全警示（如围挡、警示灯）是否到位？

2. 满意度问题：

您对项目施工期间的噪音、尘土等影响是否满意？

您对项目施工期间的交通疏导措施是否满意？

您对项目施工期间的沟通与信息公示是否满意？

施工期间，您认为公厕设置的临时替代方案是否满意？

您对电力改迁施工过程是否满意？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。



三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员将在库尔勒市住房和城乡建设局的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 66 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次巴财建〔2024〕81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目满意度调查问卷报告的信度为 0.86。

（二）效度分析



效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目满意度调查问卷报告问卷效度汇总

题目	效度得分
您对项目施工期间的交通疏导措施是否满意？	0.81
您对电力改迁施工过程是否满意？	0.78
您对项目施工期间的噪音、尘土等影响是否满意？	0.82
施工期间，您认为公厕设置的临时替代方案是否满意？	0.81
您对项目施工期间的沟通与信息公示是否满意？	0.79

五、调查问卷的分析

（一）单选题

1.您的性别？



在 66 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 46.97%，选女的比例为 53.03%。

2.您的身份？

在 66 份有效问卷中，被调查对象中选周边居民的比例为 46.97%，选商户经营者的比例为 22.73%，选上班族（通勤经过）的比例为 24.24%，选其他的比例为 6.06%。


3.施工期间的安全警示（如围挡、警示灯）是否到位？

在 66 份有效问卷中，被调查对象中选警示充分，安全感强的比例为 66.67%，选警示不足，存在安全隐患的比例为 27.27%，选未注意到警示措施的比例为 6.06%。

（二）满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 69.94%，满意度水平一般。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对项目施工期间的噪音、尘土等影响是否满意？（68.49%）、您对项目施工期间的交通疏导措施是否满意？（69.39%）、您对项目施工期间的沟通与信息公示是否满意？

（69.70%）、施工期间，您认为公厕设置的临时替代方案是否满意？（70.61%）、您对电力改迁施工过程是否满意？（71.52%）。具体如下图所示。

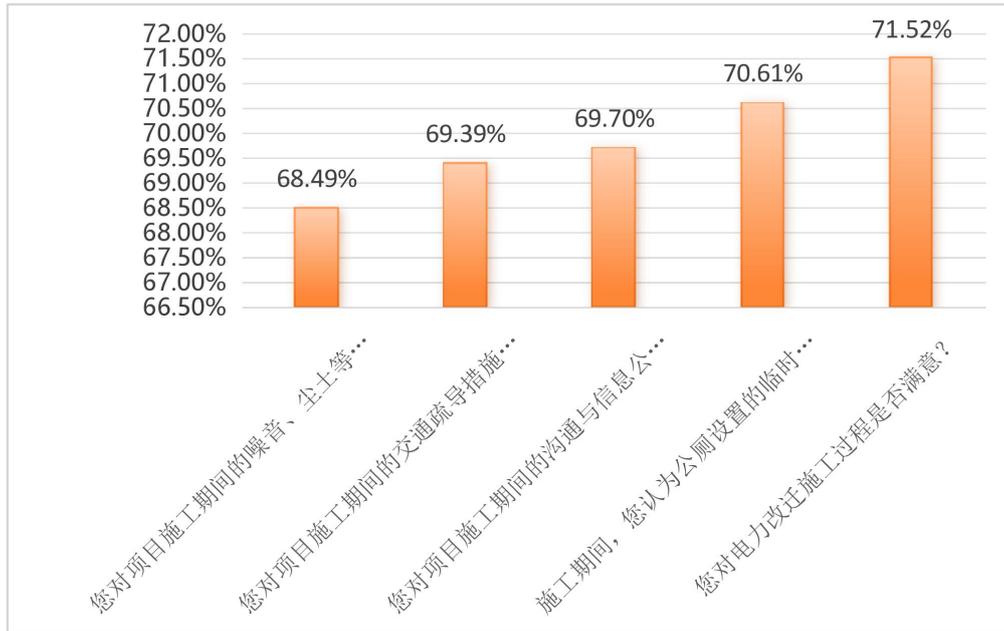

六、意见及建议

无。



附件 5 访谈提纲

巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新 改造项目（地方一般债券）资金预算的通知 项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项时间与背景；

（2）项目立项的目标；

（3）巴财建〔2024〕81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知项目资金预算的通知资金实施内容与实施情况；

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

6.通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

7.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？



访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
兵团建管	付如青	18276282701	
市住建局	谢辉	15276245537	
兵团建局	杜中平	15209960720	





附件 6 现场照片











